



H.XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS
LOS CABOS

PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES

- **Obligación 34 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno, establecida en el Artículo 68 de la LGCG).- Programas con Recursos federales: 2022**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 28-dic-22

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS					
Fecha de Inicio de la Obra:		03/06/22	Fecha Terminación de la Obra:		02/09/22
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
22.942977*, -109.948411*					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2438357		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	03/05/2022	Fecha Presenta Propuestas	25/05/2022	Fecha Fallo	01/06/2022
Fecha Inicio Contrato	03/06/2022	Fecha Termino Contrato	02/09/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,081,265.53	\$ -	\$ -	\$ 3,038,575.07	\$ -	\$ 5,119,840.60

Datos requeridos
102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
0.00%	25.00%	36.00%	29.00%	5.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
\$ -	\$ 1,295,744.06	\$ 1,861,349.90	\$ 1,467,940.55	\$ 247,403.05	\$ 247,403.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,119,840.60	

MES	Avance Físico Real en el MES (%)		Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
	FISICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Mayo	0%		\$ -	\$ -
Junio	12%	La mayor inversión corresponde al anticipo	\$ 1,387,510.35	\$ -
Julio	28%		\$ 591,037.85	\$ -
Agosto	45%		\$ 730,680.18	\$ 730,680.18
Septiembre	5%		\$ 1,241,824.34	\$ 1,047,293.53
Octubre	10%	En proceso de cierre con el departamento de supervisión de obras	\$ -	\$ -
Noviembre	0%		\$ -	\$ -
Diciembre	0%		\$ 1,168,787.88	\$ 303,291.82
Total Acumulado	100.00%		\$ 5,119,840.60	\$ 2,081,265.53

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: RURAL Fecha: 28-dic-22

F1-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:
 Descripción de la Obra / Acción

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COMUNIDAD DE SANTIAGO

Fecha de Inicio de la Obra: 03/06/22 Fecha Terminación de la Obra: 02/09/22

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 23.486591°, -109.725107°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra(s)	2438313		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	03/05/2022	Fecha Presenta Propuestas	25/05/2022	Fecha Fallo	01/06/2022
Fecha Inicio Contrato	03/06/2022	Fecha Término Contrato	02/09/2022		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,381,929.20	\$ -	\$ -	\$ 2,072,893.82	\$ -	\$ 3,454,823.02


Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
0%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%	25.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
\$ -	\$ 345,482.20	\$ 172,741.15	\$ 172,741.15	\$ 172,741.15	\$ -	\$ 863,705.76	\$ 1,727,411.51	\$ -	\$ -	\$ 3,454,823.02	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Mayo	0%	
Junio	10%	El \$1,148,467.45 corresponde al obra en ejecución y proceso de estimación
Julio	5%	
Agosto	5%	En espera de equipos, obras de recepción terminadas, los equipos se encuentran en tránsito que esto representa aproximadamente el 80% del monto contratado
Septiembre	5%	
Octubre	0%	
Noviembre	25%	En proceso de autorización la estimación comprobatoria
Diciembre	50%	
Total Acumulado	100.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)			
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL	
Mayo	\$ -	\$ -	
Junio	\$ 1,148,467.45	\$ -	
Julio	\$ -	\$ -	
Agosto	\$ -	\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -	
Diciembre	\$ 2,306,355.57	\$ 1,381,929.20	
Total Acumulado	\$ 3,454,823.02	\$ 1,381,929.20	

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

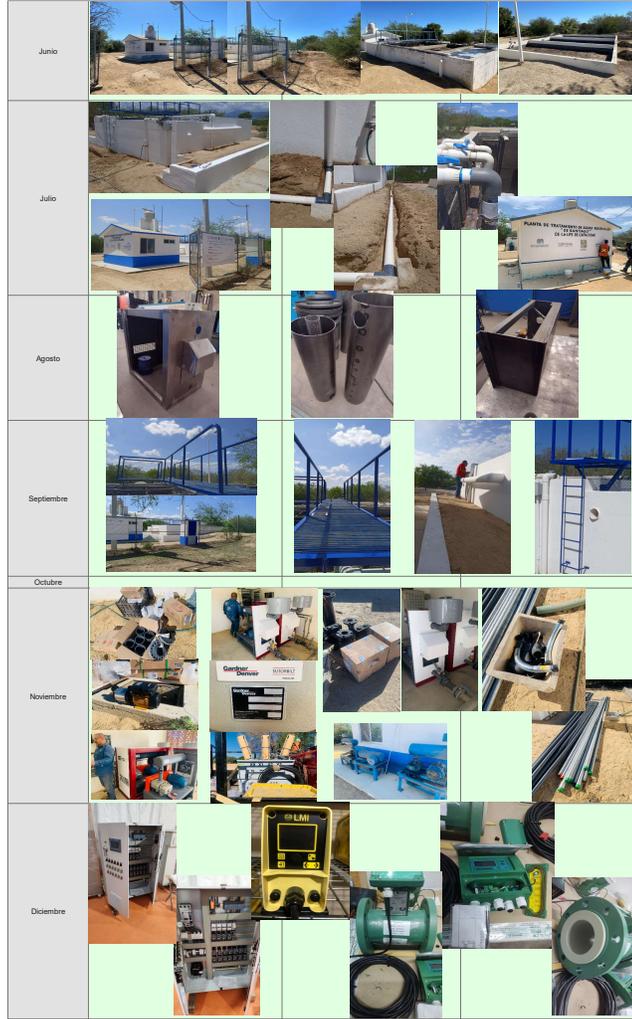

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Devis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 28-dic-22

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:				
Descripción de la Obra / Acción				
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECAS Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS				
Fecha de Inicio de la Obra:		28/07/22	Fecha Terminación de la Obra:	
			26/10/22	
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)				
22.927390*, -109.952562*				
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)				
Inversión Ejercida				
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Avance Físico (%)
				N/A
EXPEDIENTE				
No Compra/Net	2438333		Tipo de Contratación	
			Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	14/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	30/06/2022	Fecha Fallo
				14/07/2022
Fecha Inicio Contrato	28/07/2022	Fecha Termino Contrato		26/10/2022
Inversión CONTRATADA				
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)
\$ 1,409,057.73	\$ -	\$ -	\$ 1,885,853.17	\$ -
				Suma
				\$ 3,294,910.90

Datos requeridos
102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
0.00%	0.00%	2.00%	27.00%	46.00%	20.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
\$ -	\$ -	\$ 78,316.27	\$ 874,953.81	\$ 1,512,966.48	\$ 685,002.84	\$ 163,871.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,294,910.90

Avance Físico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSION TOTAL	INVERSION FEDERAL	
Mayo	0%		\$ -	\$ -	
Junio	0%		\$ -	\$ -	
Julio	15%	Obra en ejecución y proceso de estimación, el importe de \$939,371.82 corresponde al anticipo	\$ 939,371.82	\$ -	
Agosto	39%		\$ 1,418,574.21	\$ 638,358.39	
Septiembre	23%		\$ -	\$ -	
Octubre	23%		\$ -	\$ -	
Noviembre	0%	en proceso de cierre con el departamento de supervisión de obras	\$ -	\$ -	
Diciembre	0%		\$ 936,964.87	\$ 770,699.34	
Total Acumulado	100.00%		\$ 3,294,910.90	\$ 1,409,057.73	

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodriguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: **DESARROLLO INTEGRAL**

Fecha: **28-dic-22**

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS					
Fecha de Inicio de la Obra:	11/08/22	Fecha Terminación de la Obra:	10/10/22		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
23.059496°, -109.696865°					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2480471		Tipo de Contratación	Adjudicación Directa	
Fecha de Publicación	18/08/2022	Fecha Presenta Propuestas	09/08/2022	Fecha Fallo	10/08/2022
Fecha Inicio Contrato	11/08/2022		Fecha Termino Contrato	11/10/2022	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 249,400.00	\$ -	\$ -	\$ 374,100.00	\$ -	\$ 623,500.00

Datos requeridos

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	40.00%	20.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,700.00	\$ 249,400.00	\$ 124,700.00	\$ 62,350.00	\$ 62,350.00	\$ -	\$ -	\$ 623,500.00	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	15%	Estudio en ejecución y proceso de estimación.
Septiembre	50%	
Octubre	15%	
Noviembre	15%	en proceso de autorización del documento por parte de Dirección General
Diciembre	5%	
Total Acumulado	100.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)			
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL	OTROS
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ 249,400.00	\$ 124,700.00	\$ -
Diciembre	\$ 374,100.00	\$ 124,700.00	\$ -
Total Acumulado	\$ 623,500.00	\$ 249,400.00	\$ -



1.- ELABORACIÓN DE TABLERO DE CONTROL
 1.1.- Recopilación y análisis de la información disponible sobre Indicadores de Desempeño
 1.3.- Presentación, discusión y validación de los indicadores con los directivos del Organismo

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua
 Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua
 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
 Ing. Ismael Rodriguez Piña
 Director General
